

Plan Director para Consejo

Soliss AI/RPA Factory - P0 Infraestructura Crítica

Proyecto on-premise, federado, gobernado y preparado para casos de uso derivados

Cliente	Soliss / Grupo Soliss
Proponente	Keedio
Objeto	P0 como proyecto único contratado; UC1-UC7 como casos de uso derivados
Horizonte	24 meses de base + 12 meses opcionales
Infraestructura	On-premise a cargo de Soliss; Keedio no compra ni revende máquinas
Carácter	Documento cerrado para Consejo y revisión ejecutiva/técnica
P0 debe aprobarse como proyecto de infraestructura crítica para industrializar IA/RPA en Soliss con seguridad, gobierno, resiliencia y trazabilidad. Los proyectos P1-P7 pasan a formularse como casos de uso derivados que solo se activarán tras gates de alcance, valor, datos, seguridad e inversión.	

1. Decisión ejecutiva tras la revisión profunda

La propuesta queda reestructurada para eliminar ambigüedad económica y de alcance. Soliss no contrataría ocho proyectos simultáneos. El contrato se centra en P0, que construye la infraestructura crítica, el modelo operativo y los habilitadores comunes. El resto de iniciativas pasan a gestionarse como casos de uso derivados, priorizados y activables mediante gates posteriores.


Decisión	Criterio cerrado
Proyecto contratado	P0 - Infraestructura Crítica Soliss AI/RPA Factory.
P1-P7	No se presupuestan como proyectos cerrados dentro de P0; se convierten en UC1-UC7 derivados.
Arquitectura	On-premise, Rancher/RKE2, clústeres Kubernetes, data mesh federado, Gravitino PoC, Keycloak, Model Gateway y RAG gobernado.
Infraestructura	Cuantificada como inversión Soliss; fuera del presupuesto Keedio.
Economics	Separación CAPEX/OPEX, precio/hora por fase, journey y gates de decisión.
Riesgo	No se promete riesgo cero; se entrega matriz de riesgos, controles, responsables, criterios de aceptación y Go/No-Go.

2. AS-IS / TO-BE y criterio de cierre

El diseño reconoce que Soliss ya dispone de capacidades IA/RPA operativas. El objetivo no es sustituir lo existente, sino industrializarlo bajo un patrón común. La situación TO-BE evita islas técnicas, reduce dependencia externa y convierte los clústeres Kubernetes en el plano central de operación de IA/RPA.



TO-BE: de capacidades IA/RPA locales a plataforma corporativa gobernada

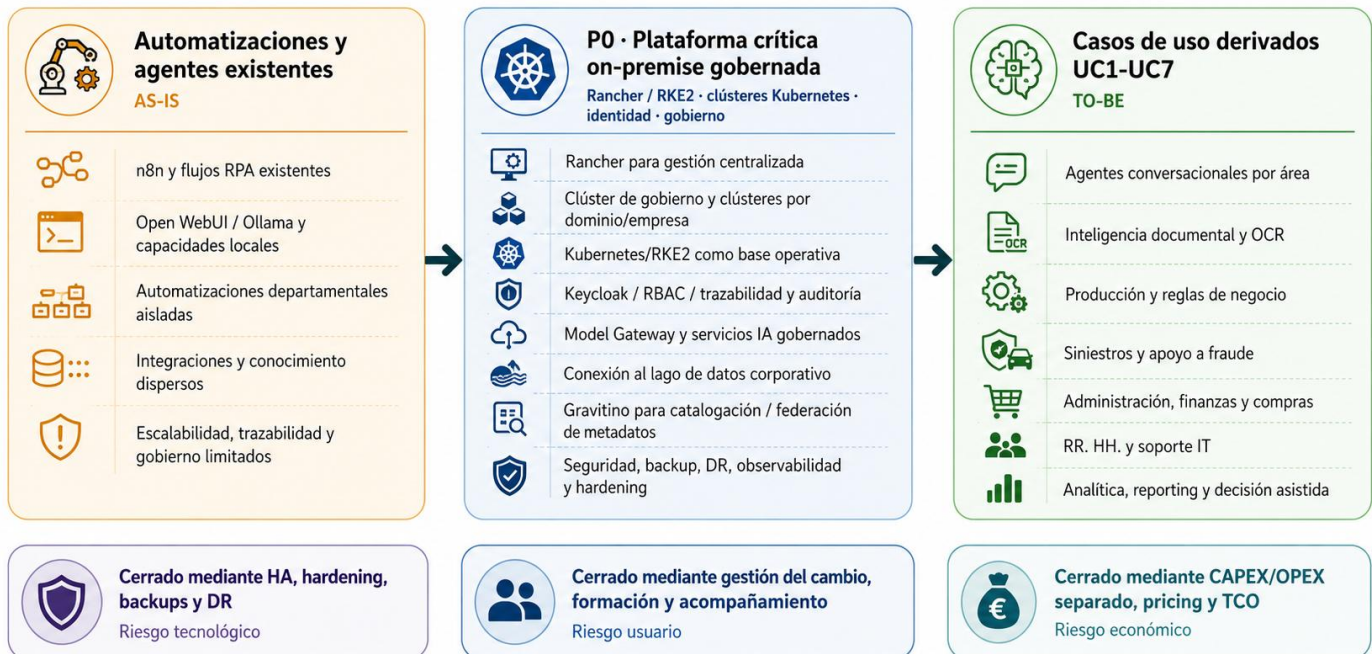


Criterio de cierre tecnológico y de usuario

La propuesta queda cerrada cuando cada entregable de P0 tiene responsable, criterio de aceptación, fase, coste, tipo CAPEX/OPEX, riesgo asociado, control de mitigación, usuario validador y gate ejecutivo.

3. TO-BE tecnológico: infraestructura crítica on-premise

La arquitectura se plantea como infraestructura crítica: Rancher gestiona la flota de clústeres RKE2; el clúster de grupo concentra identidad, catálogo, metadatos y servicios transversales; cada empresa/dominio opera en su clúster propio; y los servicios de IA/RPA se conectan verticalmente mediante Model Gateway, RAG gobernado, Gravitino PoC y observabilidad.

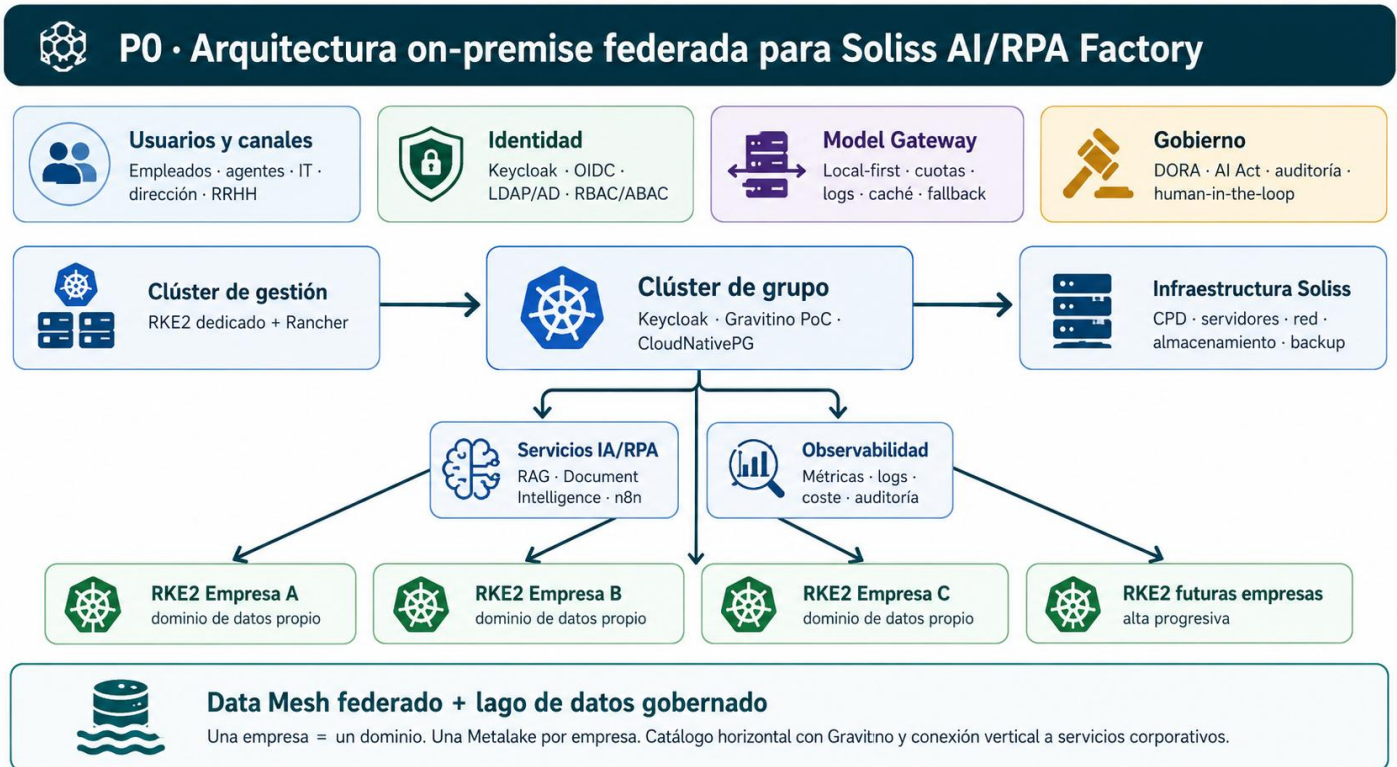

4. Alcance P0 y casos de uso derivados

Código	Iniciativa	Tratamiento en esta propuesta	Alcance cerrado
UC1	Agentes conversacionales corporativos	Casos de uso derivados	No se desarrolla vertical completa en P0; se deja backlog, arquitectura y criterios de arranque.
UC2	Document Intelligence e imagen	Casos de uso derivados	P0 valida patrón RAG/documental; explotación funcional queda como vertical posterior.
UC3	Producción, siniestros y fraude	Casos de uso derivados	Se define marco de seguridad, datos y explicabilidad; scoring productivo queda fuera de P0.
UC4	Analítica, actuarial y gestión	Casos de uso derivados	Se habilita data mesh/catalogación; cuadros de negocio quedan como casos posteriores.
UC5	Administración, contabilidad e inversiones	Casos de uso derivados	Se definen integraciones y gobierno documental; automatización final en fase posterior.
UC6	IT, ciberseguridad y soporte técnico	Casos de uso derivados	P0 define observabilidad y soporte; agente técnico/ciber como caso de uso derivado.
UC7	Extensión Grupo Soliss	Casos de uso derivados	P0 prepara multiclúster/multiempresa; despliegue por empresa queda bajo Go/No-Go posterior.

Fuera del alcance de P0

P0 no entrega un agente de producción completo, un motor de fraude productivo, una solución actuarial completa ni cuadros de mando finales por área. Entrega la arquitectura, gobierno, seguridad, integración, patrones, PoC, documentación y backlog priorizado para activar esos casos con seguridad.

5. Entregables generales y técnicos

5.1 Entregables generales y de gestión

Entregable	Contenido	Tipo
Plan de proyecto	Cronograma, recursos, riesgos, hitos, metodología, RACI y gates G1-G4.	General
Informes de avance	Estado, riesgos, desviaciones, decisiones, dependencias y acciones correctivas.	General
Journey + Economics	Visión Consejo con CAPEX/OPEX, inversiones, fases, gates y continuidad.	General
Gestión del cambio	Plan de adopción, formación, sesiones, perfiles, comunicación y soporte usuario.	General
Informe de cierre	Evaluación final, lecciones aprendidas, aceptación y hoja de ruta UC1-UC7.	General

5.2 Entregables técnicos, usuario y operación

Entregable	Contenido	Tipo
Especificaciones funcionales	Qué debe hacer P0 desde la perspectiva de usuarios IT, negocio, seguridad, gobierno y operación.	Técnico/funcional
Especificaciones técnicas	Arquitectura, APIs, identidad, datos, modelos, integraciones, red, seguridad y operación.	Técnico
Diseños de solución	Diagramas, flujos, modelo TO-BE, patrones Kubernetes, data mesh y servicios verticales.	Técnico
Plan de pruebas	Casos de prueba, criterios de aceptación, cobertura, UAT, regresión y pruebas de continuidad.	Técnico
Código fuente / IaC	Repositorios, manifiestos, scripts, versiones, documentación y trazabilidad de cambios.	Técnico
Manual técnico	Instalación, configuración, mantenimiento, backup, restore, monitorización y operación N1/N2.	Técnico
Manual de usuario	Guías para perfiles de usuario, roles, acceso, buenas prácticas, soporte y límites de la IA.	Usuario

6. Fases, horas y precio/hora

Para responder a la petición de Alberto, el presupuesto queda trazado por fase, horas, precio medio/hora, tipo de imputación y entregable asociado. La activación inicial se separa expresamente del resto del programa.

Fase	Nombre	Periodo	Horas	Precio medio	Importe	CAPEX/OPEX	Resultado
F0	Activación P0 y cierre de alcance	M1	160	125,00 €/h	20.000,00 €	CAPEX	Arranque, discovery, gobierno inicial, alcance, backlog UC y plan director definitivo.
F1	Blueprint on-premise y sizing de infraestructura	M1-M2	220	110,00 €/h	24.200,00 €	CAPEX	Rancher/RKE2, clústeres, red, almacenamiento, backup, seguridad y adquisición Soliss.
F2	Gobierno, DORA, data mesh e identidad	M2	180	105,00 €/h	18.900,00 €	CAPEX	Modelo de dominios, Keycloak, RBAC/ABAC, metadatos, evidencias y controles.
F3	Sandbox técnico, Model Gateway, RAG y Gravitino PoC	M2-M3	310	110,00 €/h	34.100,00 €	CAPEX	Validación técnica no bloqueante, local-first, trazabilidad, fuentes y seguridad de acceso.
F4	Pruebas, UAT, documentación, transferencia y cierre P0	M3	85	105,00 €/h	8.925,00 €	CAPEX	Plan de pruebas, manuales, runbooks, formación y aceptación ejecutiva.
Ajuste	Ajuste comercial de consolidación	-	0	-	-338,80 €	CAPEX	Ajuste para mantener importe consolidado de construcción P0.

Importe P0 construcción

La construcción P0 queda en 105.786,20 €. La activación inicial de P0 se separa en torno a 20.000 €. El servicio co-gestionado M3-M24 asciende a 77.000 € y se trata como OPEX.

7. Journey + Economics para Consejo



Journey + Economics: P0 como infraestructura crítica y casos de uso derivados



Lectura económica para Consejo



Concepto	Importe	Tratamiento	Comentario
Activación inicial P0	20.000,00 €	CAPEX	Arranque, discovery, alcance, arquitectura inicial y plan de trabajo.
Construcción fundacional P0	105.786,20 €	CAPEX	Incluye activación, diseño, PoC, integración, documentación, pruebas y transferencia.
Servicio co-gestionado M3-M24	77.000,00 €	OPEX	Soporte, gobierno, observabilidad, evolución controlada y acompañamiento.
Total Keedio 24 meses	182.786,20 €	Mixto	CAPEX + OPEX, sin infraestructura productiva.
Año opcional M25-M36	42.000,00 €	OPEX opcional	Extensión no obligatoria.
Infraestructura Soliss	Rango estimado	CAPEX Soliss	Compra/contratación directa de Soliss; Keedio dimensiona y valida.

8. Cuantificación de infraestructura Soliss

La infraestructura se cuantifica como rango orientativo para que Soliss pueda activar compras, presupuestos internos y análisis CAPEX. Keedio no la compra ni revende. El importe final debe cerrarse con proveedores tras sizing de G2.

Bloque infraestructura	Contenido	Mínimo	Base	Escalable
Clúster de gestión Rancher/RKE2	3 nodos de control, HA, acceso administrativo, TLS/CA interna	18.000 €	30.000 €	45.000 €
Clúster de grupo	Keycloak, Gravitino PoC, PostgreSQL/CloudNativePG, servicios de gobierno	25.000 €	45.000 €	70.000 €
Clúster empresa piloto	Plano de datos inicial, conectores, pipelines y aislamiento por dominio	30.000 €	55.000 €	90.000 €
GPU/IA local	Model Gateway, embeddings, OCR/visión y LLM local-first	20.000 €	50.000 €	110.000 €
Almacenamiento/backup	Objeto on-premise tipo MinIO/Ceph, snapshots, backup, restore y retención	15.000 €	35.000 €	70.000 €
Red/seguridad/observabilidad	VPN/interconexión privada, segmentación, logging, monitorización y hardening	12.000 €	30.000 €	60.000 €

Soporte/licencias base opcionales	Rancher Prime, soporte fabricante, garantía extendida u otros contratos	0 €	25.000 €	70.000 €
Cierre de riesgo de inversión La compra no debe producirse antes del gate G2. En G2 se validan blueprint, sizing físico, dependencias, red, backup, continuidad y criterios de soporte.				

9. Gestión del cambio y perfiles

El proyecto incorpora gestión del cambio técnica y organizativa. La clave es nombrar un responsable interno Soliss con visión transversal técnica y de negocio, acompañado por responsables de infraestructura, datos, seguridad y usuarios clave.

Perfil	Responsabilidad	Dedicación estimada
Sponsor ejecutivo Soliss	Priorizar, desbloquear decisiones, aceptar gates y comunicar valor.	2-4 h/mes
Responsable interno AI/RPA Factory	Liderar áreas técnicas y negocio, coordinar decisiones y adopción.	30-50% M1-M3; 15-25% M4-M24
Responsable infraestructura Soliss	CPD, red, servidores, almacenamiento, backup y soporte de base.	20-40% M1-M3; 10-20% posterior
Responsable datos/gobierno Soliss	Dominios, ownership, sensibilidad, calidad y acceso a datos.	15-30% M1-M3
Key users negocio	Validar necesidades, UAT, manual de usuario y casos derivados UC1-UC7.	Sesiones por sprint
Keedio PM/Arquitecto	Dirección, arquitectura, control de riesgos, coordinación y entregables.	Incluido
Keedio Data/AI Engineer	Model Gateway, RAG, metadatos, pipelines y pruebas técnicas.	Incluido
Keedio Infra/Sec Engineer	Rancher/RKE2, seguridad, laC, observabilidad, runbooks y soporte.	Incluido

10. Soporte, operación y modelo de servicio

Nivel	Responsable	Alcance	Resultado
N0 - Usuario/key user	Soliss	Uso funcional, dudas básicas, feedback y validación de UAT.	Adopción controlada.
N1 - Operación interna	Soliss con transferencia Keedio	Operación guiada, incidencias simples, revisión de paneles, ejecución de runbooks.	Autonomía progresiva.
N2 - Soporte especializado	Keedio	Arquitectura, Kubernetes, Model Gateway, RAG, metadatos, seguridad y debugging técnico.	Continuidad y reducción de riesgo.
N3 - Fabricantes/comunidad	Soliss/Keedio según contrato	Rancher Prime/SUSE si se activa, soporte hardware, red, almacenamiento, backup.	SLA externo si Soliss lo contrata.

11. Matriz de riesgos y controles de cierre

No existe un proyecto sin riesgo. El cierre consiste en que cada riesgo esté identificado, mitigado, asignado y validado por gate. Esta matriz debe revisarse en cada comité.

ID	Riesgo	Criticidad	Control de cierre	Responsable
R1	Infraestructura insuficiente o compra no alineada	Alto	Sizing formal, opción mínima/base/objetivo, validación IT, gate G2 antes de compra.	Soliss + Keedio
R2	Gravitino inmaduro para producción regulada	Medio	PoC sandbox no bloqueante, Go/No-Go documentado, no dependencia crítica inicial.	Keedio
R3	Exposición de datos personales o sensibles	Alto	Local-first, RBAC/ABAC, Keycloak, metadatos de sensibilidad, auditoría y human-in-the-loop.	Soliss + Keedio
R4	Shadow AI y costes no controlados	Alto	Model Gateway único, cuotas, logging, caché, fallback aprobado y FinOps IA.	Keedio
R5	Baja adopción por usuarios o áreas de negocio	Medio	Gestión del cambio, champions, formación, UAT, manuales y soporte N1/N2.	Soliss
R6	Operación difícil tras la entrega	Medio	Runbooks, laC, sesiones de transferencia, soporte co-gestionado y matriz RACI.	Keedio + Soliss

R7	No conformidad DORA/AI Act	Alto	Compliance-by-design, registro de componentes, controles, logs, pruebas y evidencias.	Soliss + Keedio
R8	Dependencia excesiva de proveedor	Medio	On-premise, open source, repositorios entregables, documentación y contratos de soporte separados.	Soliss

12. Gates, pruebas y aceptación

Gate	Momento	Paquetes	Decisión de cierre
G1	Semana 2	F0 / WP0-WP1	Inventario, alcance, exclusiones, responsables y backlog UC1-UC7 aceptados.
G2	Semana 6	F1-F2 / WP2-WP4	Blueprint on-premise, sizing, inversión Soliss, data mesh y enfoque DORA aprobados.
G3	Semana 9	F3 / WP5-WP9	Sandbox técnico validado: Keycloak, Model Gateway, RAG, Gravitino PoC, observabilidad y controles de acceso.
G4	Semana 12	F4 / WP10-WP12	UAT, runbooks, manuales, formación, informe de cierre y roadmap de casos de uso aprobados.
Criterio Go/No-Go Cada gate debe dejar acta. Si un componente no alcanza madurez suficiente, se documenta como exclusión o riesgo aceptado, sin bloquear la continuidad del resto de la arquitectura.			

13. Recomendación final

Se recomienda aprobar P0 como proyecto de infraestructura crítica para Soliss AI/RPA Factory, sujeto a cuatro condiciones de control: 1) validación del alcance inicial, 2) aprobación del sizing e inversión on-premise en G2, 3) Gravitino únicamente como PoC no bloqueante hasta Go/No-Go, y 4) activación de casos UC1-UC7 solo mediante business case posterior.

Decisión solicitada	Motivo	Riesgo si no se decide
Aprobar P0	Permite pasar de iniciativas aisladas a plataforma gobernada.	Crecimiento por islas, Shadow AI y costes dispersos.
Nombrar líder interno Soliss	Necesario para coordinar áreas técnicas y negocio.	Bloqueos de decisión y baja adopción.
Autorizar fase de activación	Permite cerrar alcance, sizing e inversión con datos reales.	Ambigüedad económica y técnica.
Separar infra Soliss y servicios Keedio	Reduce riesgo DORA y evita dependencia patrimonial.	Confusión de responsabilidades y contratos.

14. Fuentes técnicas y regulatorias de contraste

Fuente	Uso en la propuesta	URL
RKE2	Distribución Kubernetes con foco en seguridad y cumplimiento.	https://docs.rke2.io/
Rancher Manager	Gestión de clústeres Kubernetes y operación de flota.	https://ranchermanager.docs.rancher.com/getting-started/overview
Apache Gravitino	Metadata lake federado, gobierno de metadatos, metalakes y catálogo.	https://gravitino.apache.org/docs/1.0.0/overview/
CloudNativePG	PostgreSQL en Kubernetes y backup mediante plugins CNPG-I/Barman Cloud.	https://cloudnative-pg.io/docs/1.28/backup/
DORA	Reglamento UE 2022/2554 de resiliencia operativa digital.	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2554
AI Act	Reglamento UE 2024/1689 y Anexo III para seguros de vida/salud.	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689
